

CLOSET

L'élégance durable

Planification Agile

Diagrammes de Gantt — Approche Scrum

Sprints de 2 semaines — Livraison en 8 semaines
Plateforme e-commerce & application mobile

Version	1.0
Statut	Document de travail
Rédigé par	Business Analyst / Chef de projet
Confidentialité	Usage interne

Méthodologie de travail

Le projet est piloté selon la méthode **Scrum** avec des **sprints de 2 semaines**. L'équipe de développement (backend, mobile, QA) travaille sur un backlog priorisé. Deux cérémonies rythment chaque sprint :

- **Sprint Planning** (lundi, 10h) : sélection des stories et objectifs.
- **Sprint Review + Rétrospective** (vendredi, 15h) : démo des réalisations et axes d'amélioration.

Réunions client : chaque **mercredi à 14h** (point d'avancement, démonstration) et chaque **samedi à 10h** (validation des livrables, feedback). La **priorité est donnée à l'application mobile** (React Native). Le back-office web est réservé à l'administrateur unique. Les diagrammes de Gantt ci-dessous détaillent les 4 sprints (8 semaines).

Périmètre fonctionnel de la plateforme (MVP)

Back-office administrateur (web) – un seul utilisateur :

- Gestion complète des produits (CRUD) : photos, prix, marque, taille, état, durabilité, description, brouillon/publication.
- Gestion des codes promo (% ou montant fixe, dates, conditions de montant minimum).
- Gestion des sponsors : ajout/modification (logo, nom, lien, durée de mise en avant).
- Sélection manuelle des articles pour mise en avant périodique (pièce de la semaine / coup de cœur du mois).
- Consultation du tableau de bord : CA, commandes, stock, utilisation codes promo, demandes de dépôt.

Application mobile (iOS & Android) – clientes :

- Catalogue avec filtres (catégorie, taille, état, durabilité, prix, marque).
- Fiche produit détaillée (photos haute qualité, description, packaging mis en avant).
- Panier (ajout/suppression, persistance locale).
- Passage de commande avec adresse de livraison.
- Paiements intégrés : Orange Money, MTN Mobile Money, Visa (Stripe), PayPal.
- Application des codes promo lors du paiement.
- Page « Nous contacter » pour proposer un vêtement (formulaire avec photos, marque, prix souhaité).
- Inscription aux notifications (mail et/ou WhatsApp) pour les événements (pop-up, brunch, offres).
- Section « Sponsors premium » (carrousel ou page dédiée).
- Rubrique « Pièce de la semaine / Coup de cœur » sur l'accueil.

Systèmes transverses :


- API REST sécurisée (backend Node.js / Python).
- Notifications automatiques : email (via API) et WhatsApp (via Twilio/Meta Business).
- Alertes administrateur pour nouvelles commandes et nouvelles demandes de dépôt.
- Statuts de commande : reçue, payée, expédiée, livrée, retournée, annulée.

Hors périmètre V1 (reporté V2) : multi-devises, mode hors ligne, programme fidélité, export comptable avancé.

Légende des diagrammes de Gantt


	Développement actif (coding, tests, intégration)
	Réunion avec la cliente (mercredi 14h & samedi 10h)
	Cérémonies Scrum (Planning, Review, Rétrospective)
	Jalon de livraison (fin de sprint)
	Déploiement production / Sprint Review finale

Sprint 1 – Back-office & API produits (semaines 1–2)

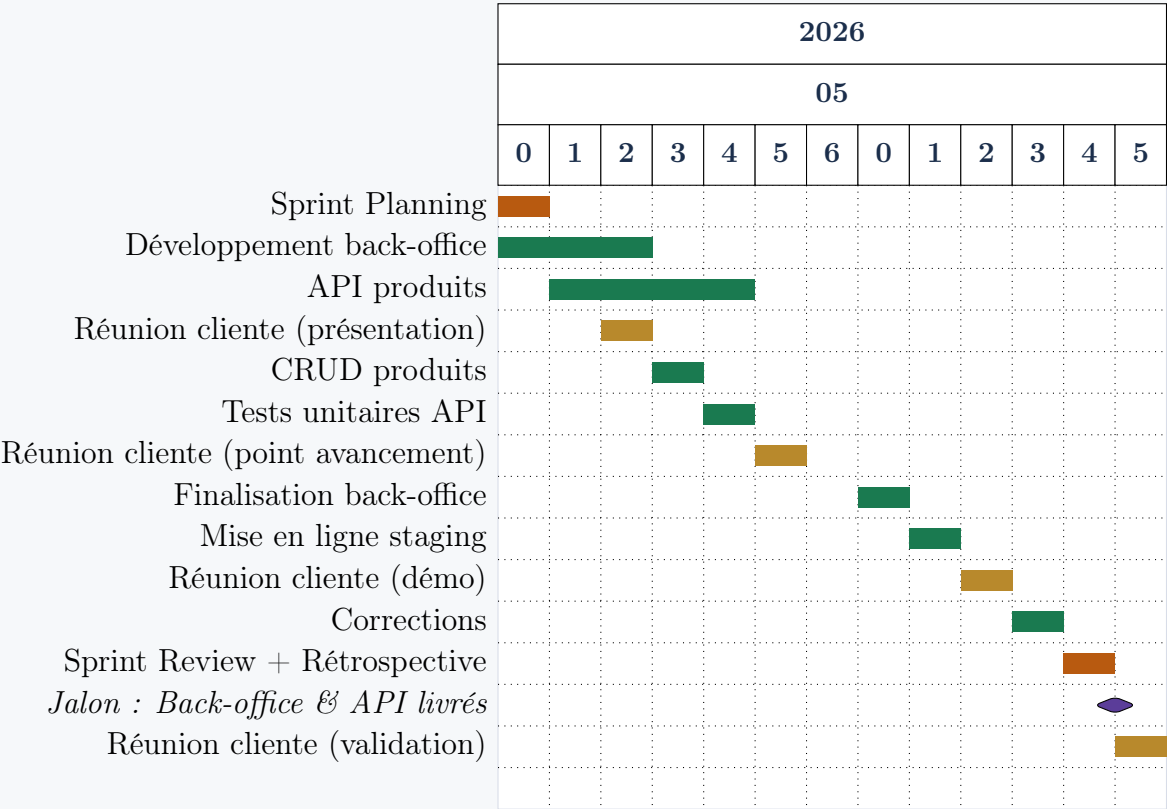


Notes : Les week-ends (dimanche) sont exclus. Réunions client mercredi 14h et samedi 10h.

Sprint 2 – Mobile : catalogue & panier (semaines 3–4)

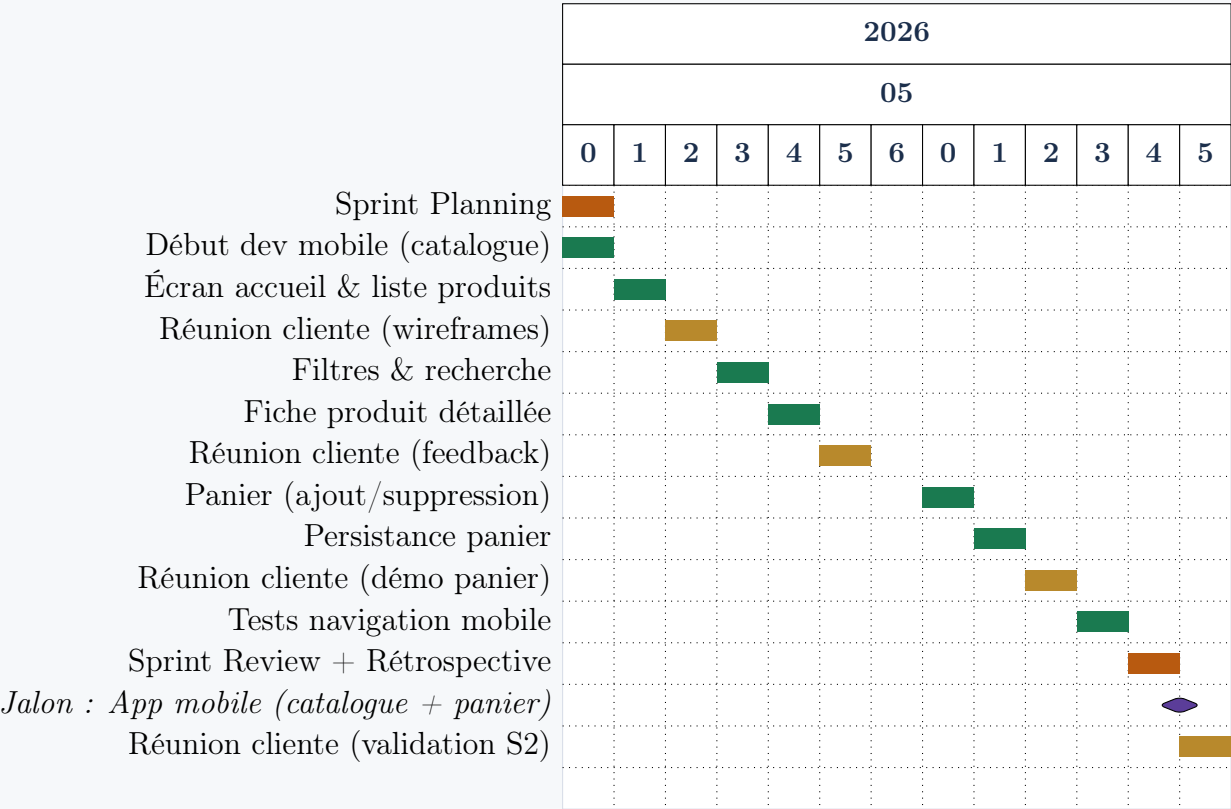

Notes : Persistance du panier via stockage local. Tests sur principaux parcours utilisateur.


Sprint 3 – Paiements & codes promo (semaines 5–6)

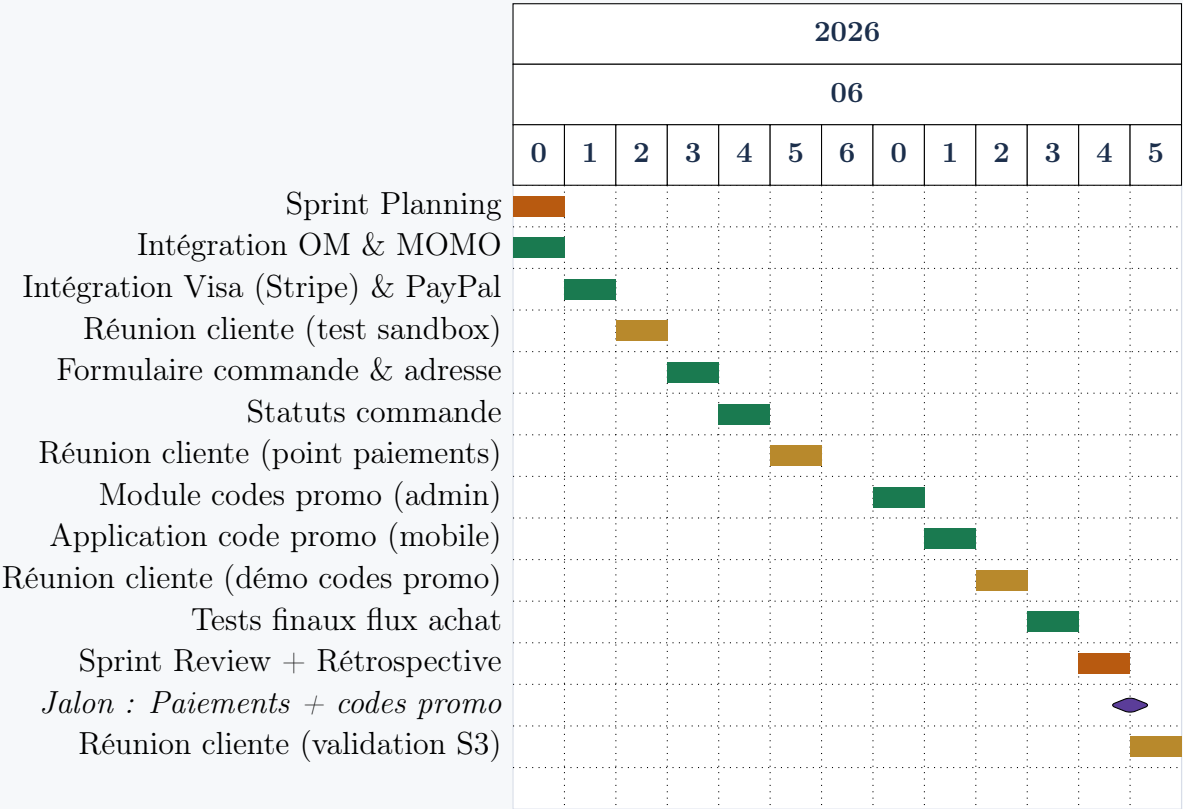

Notes : Tests effectués en sandbox pour OM, MOMO, Stripe et PayPal.

Sprint 4 – Contact, notifications, sponsors, mise en avant & déploiement

(semaines 7–8)

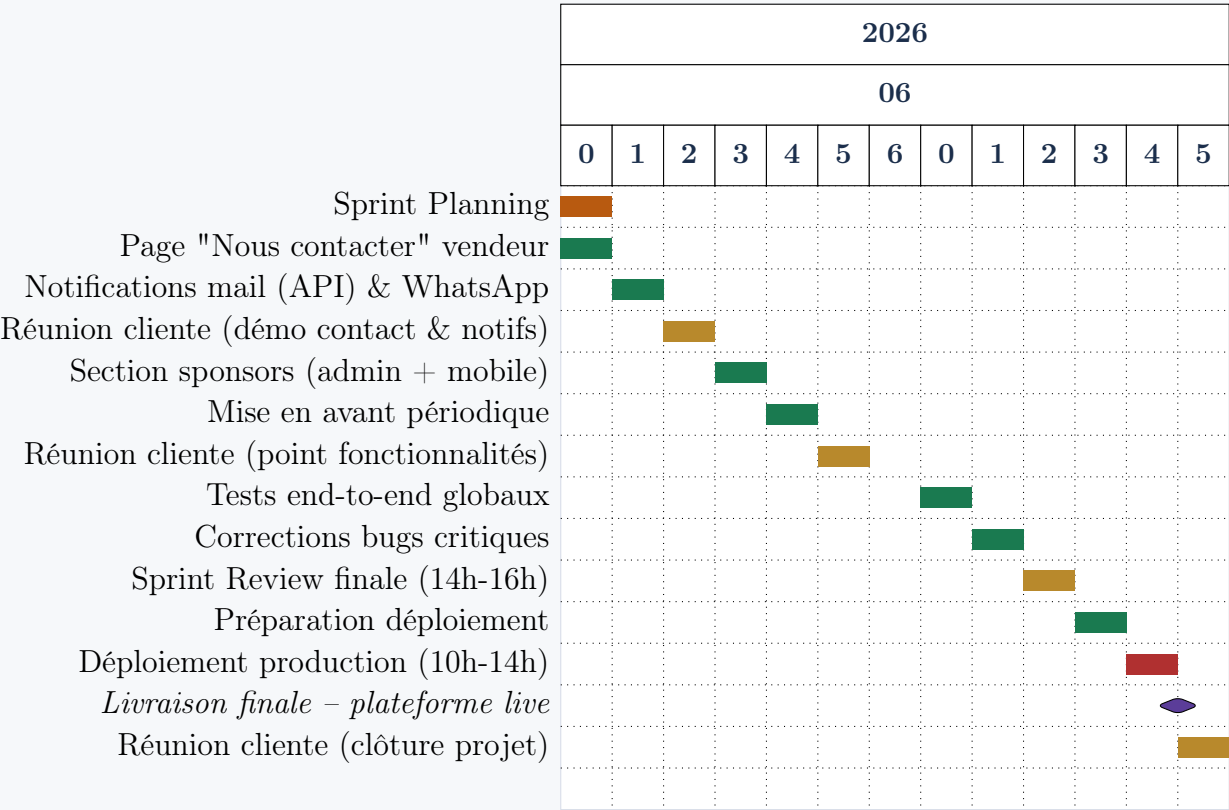

Notes : Le déploiement inclut l’API, le back-office web et la publication sur Google Play / App Store.

Indicateurs

de

performance

(KPI)

KPI	Cible	Suivi hebdomadaire
Vélocité (story points)	25 / sprint	● Vert
Taux de complétion sprint	≥ 85%	● Vert
Bugs critiques en production	0	● Vert
Délai réponse aux demandes client	< 4 h	● Vert

Réunions

client

—

Récapitulatif

Semaine	Mercredi 14h	Samedi 10h
S1	Présentation Sprint 1	Point avancement back-office
S2	Démo back-office & API	Validation Sprint 1
S3	Wireframes mobile	Feedback catalogue
S4	Démo panier	Validation Sprint 2
S5	Test sandbox paiements	Point paiements
S6	Démo codes promo	Validation Sprint 3
S7	Démo contact & notifs	Point fonctionnalités annexes
S8	Sprint Review finale (14h-16h)	Clôture projet

Note de pilotage : Ce planning est la feuille de route de la phase MVP. Toute modification de périmètre doit être validée lors d’une réunion client et impacte le diagramme de Gantt. Les indicateurs KPI sont relevés chaque fin de sprint.
